



**Contrato 147 de 2014
4G CARTAGENA BARRANQUILLA Y
CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD**



Agencia Nacional de
Infraestructura

2021-10-01

Contrato :	147 del 24 de octubre de 2014
Objeto:	Interventoría técnica, económica, financiera, jurídica, administrativa, operativa, medio ambiental y socio predial de los contratos de concesión bajo un esquema de asociación público-privada que se derive de los procesos licitatorios No. VJ-VE-IP-LP-011-2013 correspondiente al corredor concesionado "Cartagena-Barranquilla".
Interventoría:	MAB INGENIERIA
Fecha de adjudicación:	24 de octubre de 2014
Firma del contrato:	24 de octubre de 2014
Firma del Acta de Inicio:	31 de octubre de 2014
Fecha de terminación:	03 de noviembre de 2021
Plazo del proyecto:	84 MESES
Valor total:	\$38.009.814.214 a diciembre de 2013.

Contrato:	004 del 10 de septiembre de 2014
Objeto:	Otorgamiento de una Concesión para que, de conformidad con lo previsto en el Contrato, el Concesionario, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo el proyecto.
Contratistas:	ISA inversiones Costera Chile SPA
Fecha de adjudicación:	10 septiembre de 2014
Firma del contrato:	10 septiembre de 2014
Firma del acta de inicio:	10 septiembre de 2014
Fecha de terminación:	04 de noviembre de 2039
Plazo del proyecto	25 a 29 años
Valor total:	(\$1.709.364.530.216) constantes de 2012.

2021-10-01

UF	Código de Vía	ORIGEN	DESTINO	LONGITUD (Según Contrato de Concesión Km)
1	90 A 01	PR 0 + 000	PR 7 + 500	7.50
		PR -2+000	PR0+350	2.35
2		PR 1 + 305	PR 7 + 500	5.60
3		PR16+000	PR16+685	9.4
		PR16+685	PR88+060	72.11
4		PR86+060	PR37+150	9.07
5	25 AT 04	PR 37 + 150	PR 109 + 133	12
6		PR 68+000 de la vía 2516	PR 112 + 300 de la vía 3006	17.00
6		PR 112 + 300 de la vía 3006	PR 105 + 000 de la vía 90 A 01	12.00
6	PR 105 + 000 de la vía 90 A 01	Glorieta de la Flores	7.70	
TOTAL				151.43

El proyecto se divide en 6 unidades funcionales. De esta manera se puede mostrar el avance físico y financiero de cada una de estas unidades funcionales por separado, adicional a la información general del proyecto. (Nota: La unidad funcional 3 se incorporó al proyecto el 07 de noviembre de 2019).



Evaluación acumulada del proyecto Inversión total	2021-07-01	AL:	2021-09-30	
	Desde	Hasta	Valores	Porcentaje(*)
Programado acumulado	2021-07-01	2021-09-30	\$648,520,356,385.75	38.00%
Ejecutado acumulado	2021-07-01	2021-09-30	\$648,520,356,385.75	38.00%
Variación			\$0.00	0.00%

* Se realiza reprogramación y se ajustan los valores al avance de obra.

Evaluación acumulada del proyecto Inversión total	2021-07-01	AL:	2021-09-30	
	Desde	Hasta	Valores	Porcentaje(*)
Programado acumulado	2021-07-01	2021-09-30	\$792,886,935,383.74	99.49%
Ejecutado acumulado	2021-07-01	2021-09-30	\$797,012,467,328.81	100.00%
Variación			\$4,125,531,945.07	0.51%


* Se realiza reprogramación y se ajustan los valores al avance de obra.



www.mab.com.co



AVANCE DE OBRA PROYECTO 4G

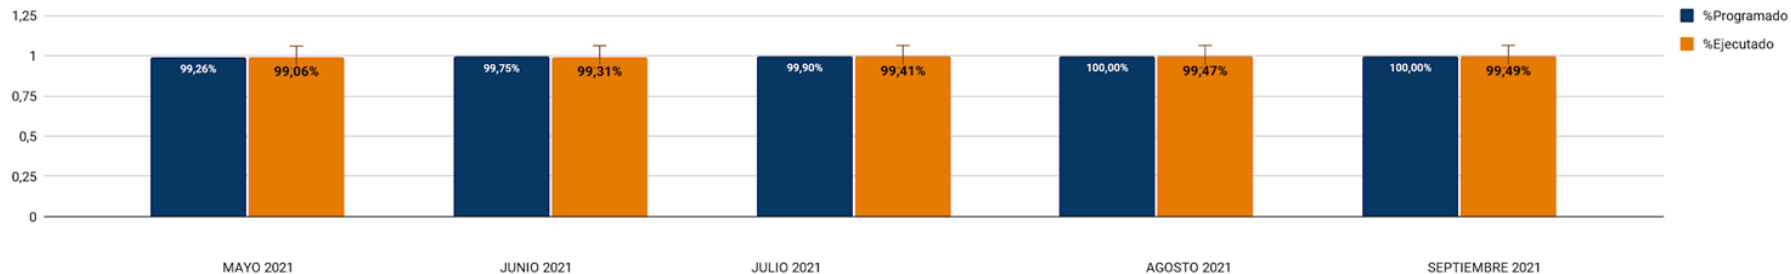

Av. El Dorado N° 69-76 | Torre 3- Ofc.
501 Bogotá D.C. Colombia



2021-10-01



Foto 1. Rehabilitación empalmes Conexión 4 Asfalto 1ra capa K31+350 CD.



Foto 2. Levantamiento planialtimétrico del ZODME (Zona de Materiales de Excavación).



Foto 3. Densidades sub-base Carril 4 Báscula Papiros K0+305/350.



Foto 4. Revisión Cotas sub-base Carril 4 Báscula Papiros K0+305/350.
