



**Contrato 147 de 2014
4G CARTAGENA BARRANQUILLA Y
CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD**



Agencia Nacional de
Infraestructura

2022-07-29

Contrato :	147 del 24 de octubre de 2014
Objeto:	Interventoría técnica, económica, financiera, jurídica, administrativa, operativa, medio ambiental y socio predial de los contratos de concesión bajo un esquema de asociación público-privada que se derive de los procesos licitatorios No. VJ-VE-IP-LP-011-2013 correspondiente al corredor concesionado "Cartagena-Barranquilla".
Interventoría:	MAB INGENIERIA
Fecha de adjudicación:	24 de octubre de 2014
Firma del contrato:	24 de octubre de 2014
Firma del Acta de Inicio:	31 de octubre de 2014
Fecha de terminación:	27 de febrero de 2023
Plazo del proyecto:	100 MESES
Valor total:	\$44.224.522.868 a diciembre de 2013.

Contrato:	004 del 10 de septiembre de 2014
Objeto:	Otorgamiento de una Concesión para que, de conformidad con lo previsto en el Contrato, el Concesionario, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo el proyecto.
Contratistas:	ISA inversiones Costera Chile SPA
Fecha de adjudicación:	10 septiembre de 2014
Firma del contrato:	10 septiembre de 2014
Firma del acta de inicio:	10 septiembre de 2014
Fecha de terminación:	04 de noviembre de 2039
Plazo del proyecto	25 a 29 años
Valor total:	(\$1.709.364.530.216) constantes de 2012.


2022-07-29

UF	Código de Vía	ORIGEN	DESTINO	LONGITUD (Según Contrato de Concesión Km)
1	90 A 01	PR 0 + 000	PR 7 + 500	7.50
		PR -2+000	PR0+350	2.35
2		PR 1 + 305	PR 7 + 500	5.60
3		PR16+000	PR16+685	9.4
		PR16+685	PR88+060	72.11
4		PR86+060	PR37+150	9.07
5	25 AT 04	PR 68+000 de la vía 2516	PR 112 + 300 de la vía 3006	17.00
6		PR 112 + 300 de la vía 3006	PR 105 + 000 de la vía 90 A 01	12.00
6		PR 105 + 000 de la vía 90 A 01	Glorieta de la Flores	7.70
TOTAL				151.43



El proyecto se divide en 6 unidades funcionales. De esta manera se puede mostrar el avance físico y financiero de cada una de estas unidades funcionales por separado, adicional a la información general del proyecto. (Nota: La unidad funcional 3 se incorporó al proyecto el 07 de noviembre de 2019).

AVANCE DE OBRA PROYECTO 4G

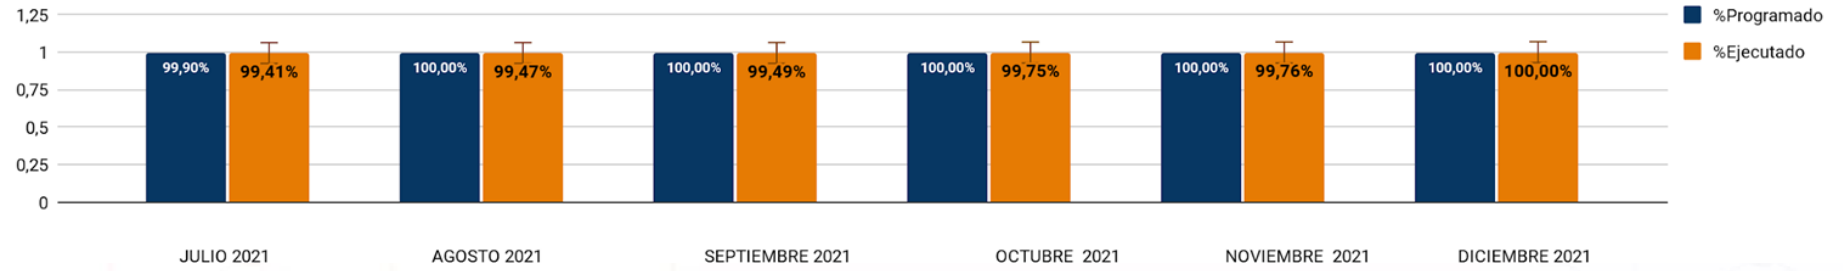

#	Fecha	Actividad ejecutada
1	2022-07-28	Actividades de obra programadas en otro si 5 y 180 días
2	2022-07-28	Actividades de inspección SSTMA : Seguimiento protocolo de bioseguridad, Inspección utilización y uso de los elementos EPI, Inspección de máquinas.
3	2022-07-28	Operación y mantenimiento: Aforo de vehículos peajes, Seguimiento a indicadores de la vía, Control PMT.



Foto 1. Instalación aceros horizontal muros del parqueadero.



Foto 2. Vaciado placas módulos 06-07.



Foto 3. Vaciado muros módulo 08.



Foto 4. Vaciado placas módulos 06-07.
