



Contrato 147 de 2014

4G CARTAGENA BARRANQUILLA Y CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD

2023-10-31

INFORMACIÓN GENERAL

Contrato :	147 del 24 de octubre de 2014
Objeto:	Interventoría técnica, económica, financiera, jurídica, administrativa, operativa, medio ambiental y socio predial de los contratos de concesión bajo un esquema de asociación público-privada que se derive de los procesos licitatorios No. VJ-VE-IP-LP-011-2013 correspondiente al corredor concesionado "Cartagena-Barranquilla".
Interventoría:	MAB INGENIERIA
Fecha de adjudicación:	24 de octubre de 2014
Firma del contrato:	24 de octubre de 2014
Firma del Acta de Inicio:	31 de octubre de 2014
Fecha de terminación:	31 de octubre de 2023
Plazo del proyecto:	108 MESES
Valor total:	\$46.482.988.204 a diciembre de 2013.

Contrato:	004 del 10 de septiembre de 2014
Objeto:	Otorgamiento de una Concesión para que, de conformidad con lo previsto en el Contrato, el Concesionario, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo el proyecto.
Contratistas:	ISA inversiones Costera Chile SPA
Fecha de adjudicación:	10 septiembre de 2014
Firma del contrato:	10 septiembre de 2014
Firma del acta de inicio:	10 septiembre de 2014
Fecha de terminación:	04 de noviembre de 2039
Plazo del proyecto	25 a 29 años
Valor total:	(\$1.709.364.530.216) constantes de 2012.


2023-10-31

UF	Código de Vía	ORIGEN	DESTINO	LONGITUD (Según Contrato de Concesión Km)
1	90 A 01	PR 0 + 000	PR 7 + 500	7.50
		PR -2+000	PR0+350	2.35
2		PR 1 + 305	PR 7 + 500	5.60
3		PR16+000	PR16+685	9.4
		PR16+685	PR88+060	72.11
		PR86+060	PR37+150	9.07
4	PR 37 + 150	PR 103 + 133	12	
5	25 AT 04	PR 68+000 de la vía 2516	PR 112 + 300 de la vía 3006	17.00
6		PR 112 + 300 de la vía 3006	PR 105 + 000 de la vía 30 A 01	12.00
6		PR 105 + 000 de la vía 30 A 01	Glorieta de la Flores	7.70
TOTAL				151.43

El proyecto se divide en 6 unidades funcionales. De esta manera se puede mostrar el avance físico y financiero de cada una de estas unidades funcionales por separado, adicional a la información general del proyecto. (Nota: La unidad funcional 3 se incorporó al proyecto el 07 de noviembre de 2019).




AVANCE DE OBRA PROYECTO 4G

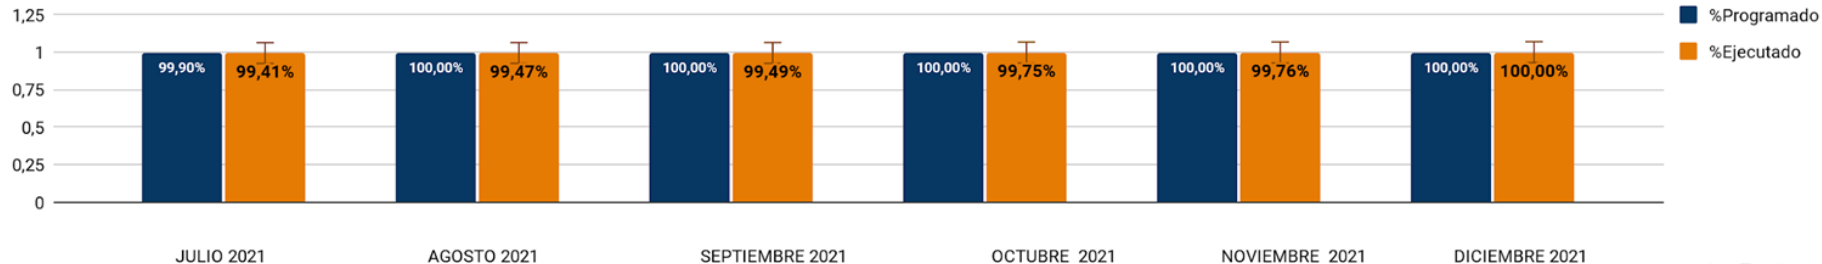

AVANCE FINANCIERO OBRA

■ EJECUTADO

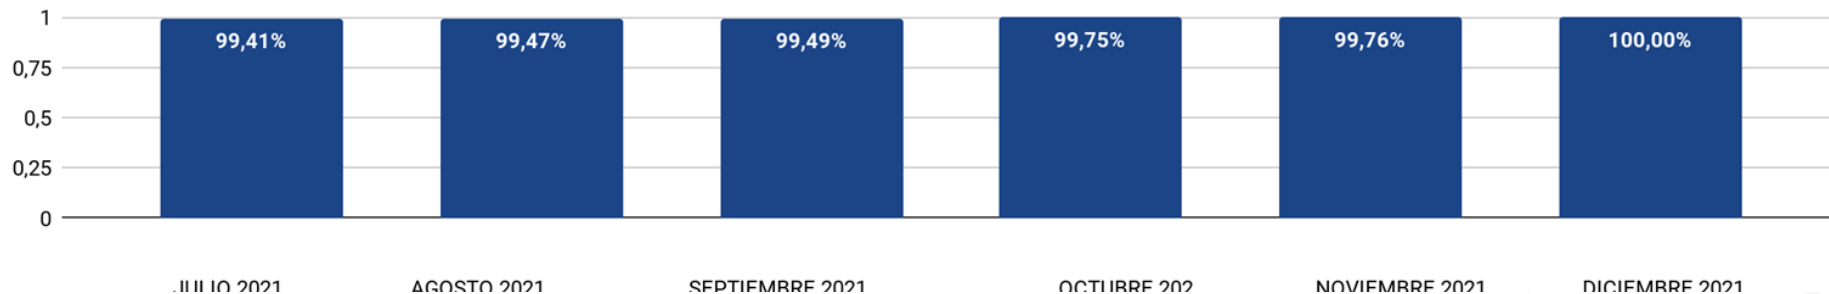

2023-10-31

OPERACIÓN DEL TRÁFICO EN PEAJES

FECHA	Peaje	Descripción.
30/10/2023	GALAPA	No se presenta novedad.
	JUAN MINA	No se presenta novedad.
	PAPIROS	<p>El Ministerio de Transporte mediante la Resolución Número 202330440045385 del 20 de octubre de 2023, resuelve:</p> <p>“Artículo 1. - Reanudar el término de suspensión del cobro de las Categorías I y II de la Caseta de control denominada Papiros localizada en el PR103+600 del trayecto Cartagena-</p> <p>“Por la cual se reanuda la suspensión del cobro a las categorías I y II en la estación de control denominada Papiros del Proyecto de Cartagena - Barranquilla y Circunvalar de la prosperidad”</p> <p><i>Barranquilla y Circunvalar de la prosperidad, hasta el día 15 de diciembre del año 2023 a las 11:59 PM.</i></p> <p>Artículo 4. - La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial”.</p>
	PUERTO COLOMBIA	No se presenta novedad.
	MARAHUACO	No se presenta novedad.



Foto 1. Revisión topográfica niveles tuberías filtro y piedra 3ra terraza.



Foto 2. Revisión topográfica niveles tuberías filtro y piedra 3ra terraza.



Foto 3. PR32+560 medición de la retroreflectividad de la señalización vertical.



Foto 4. PR20+640 medición de la retroreflectividad de la señalización vertical.

2023-10-31
